

Metodología I

Unidad 3

Gestión de Proyectos

Nombre: Farias, Gustavo

Comisión: M2025-13

Matrícula: 101662

Repositorio GitHub:


https://github.com/Lucenear/Tecnicatura_Programacion_UTN/tree/main/3er_Semestre/Metodologia_I

ACTIVIDAD 1: Roadmap de Producto

Una app de gestión de tareas colaborativas para equipos pequeños y freelancers.

Roadmap visual:

1. HORIZONTE CORTO PLAZO (0-3 meses) - MVP
2. HORIZONTE LARGO PLAZO (4-12 meses) - Evolución

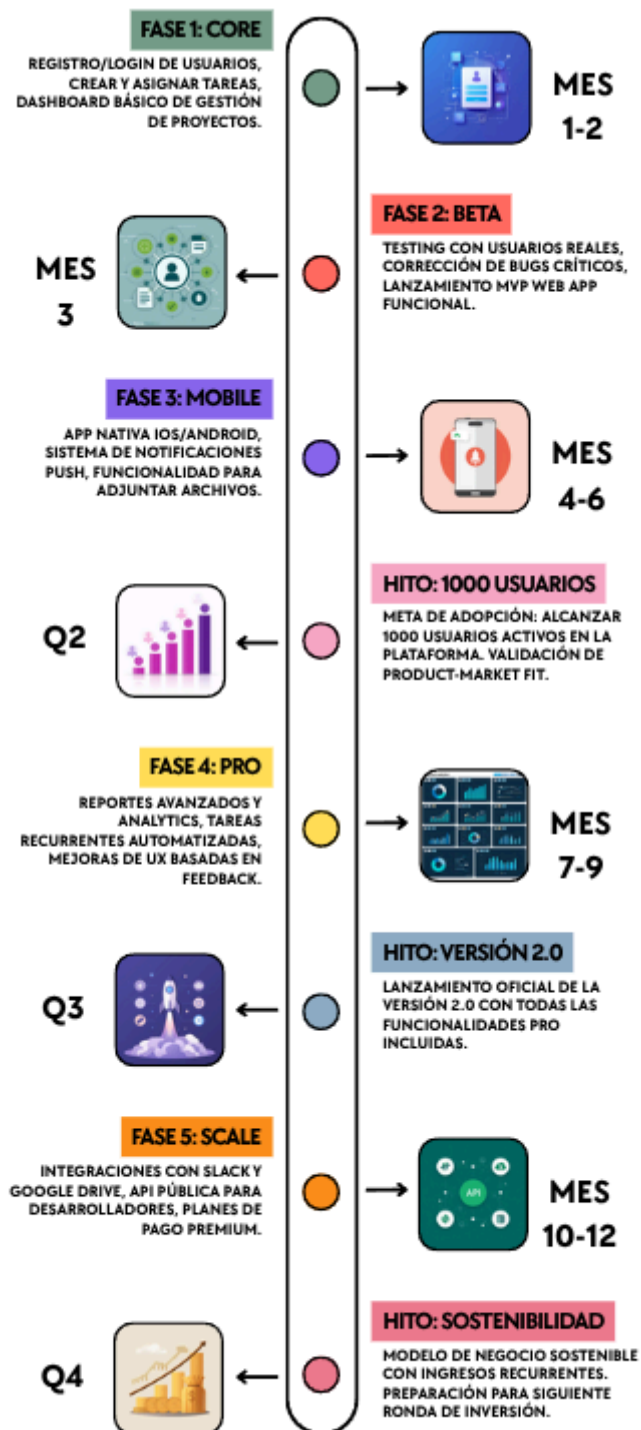

DEPENDENCIAS PRINCIPALES:

- La app móvil (Mes 4-6) depende de tener el backend estable del MVP
- Las integraciones (Mes 10-12) requieren la API pública primero
- Los planes pagos solo tienen sentido con una base de usuarios activa

COMPARACIÓN: Roadmap vs. Diagrama de Gantt

Roadmap:

- Ventaja: Comunica mucho mejor la visión estratégica y el "por qué" de cada fase. Se entiende de un vistazo hacia dónde va el producto.
- Foco: Está orientado a objetivos y resultados (ej: "Lanzar MVP", "Llegar a 1000 usuarios").
- Flexibilidad: Las fechas son aproximadas (trimestres), lo que permite adaptarse a cambios sin "romper" el plan.
- Audiencia ideal: Stakeholders, inversores, equipo de negocio.

Gantt:

- Ventaja: Es excelente para el seguimiento operativo día a día. Muestra duraciones exactas y solapamientos de tareas.
- Foco: Está orientado a actividades y cronograma (ej: "Diseñar login: 5 días", "Desarrollar API: 15 días").
- Rigidez: Las fechas son fijas; si algo se atrasa, todo el diagrama se desfasa.
- Audiencia ideal: Project managers, equipo de desarrollo para coordinación táctica.

Conclusión personal:

Para comunicar el propósito y la evolución del producto, el roadmap es infinitamente superior. Un stakeholder que mira un Gantt se pierde en los detalles operativos y no entiende la estrategia. El roadmap, en cambio, cuenta una historia: "primero validamos, después crecemos, luego escalamos". El Gantt es una herramienta de gestión interna; el roadmap es una herramienta de comunicación y alineación.

PRÁCTICA 2 - ACTIVIDAD 2: Estimación Relativa (Story Points)

Tabla de Estimación con Planning Poker

- ☐ HU1: "Como usuario quiero registrarme con email y contraseña para acceder a la plataforma"

*Puntos: 3

*Justificación: Es una funcionalidad estándar pero requiere validación de email, encriptación de contraseña y manejo de errores. No es trivial pero hay mucha documentación disponible.

*Nivel de Incertidumbre: Bajo

- ☐ HU2: "Como usuario quiero crear una tarea con título, descripción y fecha de vencimiento"

*Puntos: 2

*Justificación: Es el core del producto pero es relativamente simple: un formulario que guarda en BD. Sin dependencias complejas.

*Nivel de Incertidumbre: Bajo

- ☐ HU3: "Como usuario quiero asignar una tarea a otro miembro del equipo y que le llegue una notificación"

*Puntos: 8

*Justificación: Acá la complejidad sube: requiere sistema de usuarios, relaciones entre tareas y usuarios, y un sistema de notificaciones (email o push). Hay varias dependencias.

*Nivel de Incertidumbre: Medio

- ☐ HU4: "Como usuario quiero ver un dashboard con mis tareas pendientes, en progreso y completadas"

*Puntos: 5

*Justificación: Requiere consultas a BD con filtros, posiblemente gráficos simples, y una UI que se actualice en tiempo real. Es más complejo que un CRUD básico pero no tiene lógica de negocio rebuscada.

*Nivel de Incertidumbre: Medio

- ☐ HU5: "Como usuario quiero recibir alertas automáticas cuando una tarea está por vencer (24hs antes)"

*Puntos: 13

*Justificación: Esta es la más compleja: requiere un sistema de background jobs que corra periódicamente, calcule fechas, gestione zonas horarias, y dispare notificaciones. Además, hay que manejar casos borde (tareas sin fecha, usuarios inactivos, etc.). Alta incertidumbre en la implementación.

*Nivel de Incertidumbre: Alto

Reflexión sobre la estimación relativa

Lo interesante de usar Story Points en vez de horas es que nos obliga a pensar en el esfuerzo relativo, no en el tiempo absoluto. Por ejemplo:

Si la HU2 (crear tarea) vale 2 puntos, sabemos que la HU1 (registro) es un poco más compleja (3 puntos), pero no necesariamente "3 horas" o "3 días".

La HU5 (alertas automáticas) la estimamos en 13 no porque vayamos a tardar 13 días, sino porque es mucho más compleja que las demás. Probablemente requiera investigar, probar diferentes enfoques y manejar casos imprevistos.

El nivel de incertidumbre también es clave: cuando es alto (como en la HU5), los puntos suben no solo por la complejidad técnica, sino porque sabemos que vamos a aprender cosas en el camino que hoy no conocemos. Eso es algo que una estimación en horas no captura bien.
